Atelier Dubois Plomberie
8 rue des Tanneurs, 27000 Évreux
02 00 00 00 00
SIRET 000 000 000 00000

RAPPORT D'INTERVENTION

N° RI-2026-0002
12 novembre 2026

CLIENT
Boulangerie Martin (exemple)
12 rue de la Gare, 27200 Vernon
Interlocuteur : Mme Martin
Tél. : 02 00 00 00 00

INTERVENTION
Type : Dépannage
Date : 12 novembre 2026
Horaires : 08:15 - 09:40 (1 h 25)
Intervenant : Karim B.

DEMANDE ET CONSTAT

Appel du client à 7 h 30 : fuite sous l'évier du fournil, eau au sol.
À l'arrivée, fuite constatée au niveau du raccord du siphon, joint écrasé et écrou fissuré. Robinet d'arrêt fonctionnel.

TRAVAUX RÉALISÉS

Coupure de l'eau au robinet d'arrêt.
Dépose du siphon existant et nettoyage des portées.
Pose d'un siphon neuf diamètre 40 avec joints neufs.
Remise en eau et contrôle d'étanchéité pendant 10 minutes : aucune fuite.
Nettoyage de la zone d'intervention.

PIÈCES ET FOURNITURES

Désignation	Quantité	Unité
Siphon PVC diamètre 40 à culot démontable	1	u
Joint plat fibre 40/49	2	u

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Le flexible d'alimentation eau chaude présente des traces de corrosion : remplacement conseillé dans les 3 mois.
Prévoir un détartrage du mitigeur lors du prochain passage.

PHOTOS

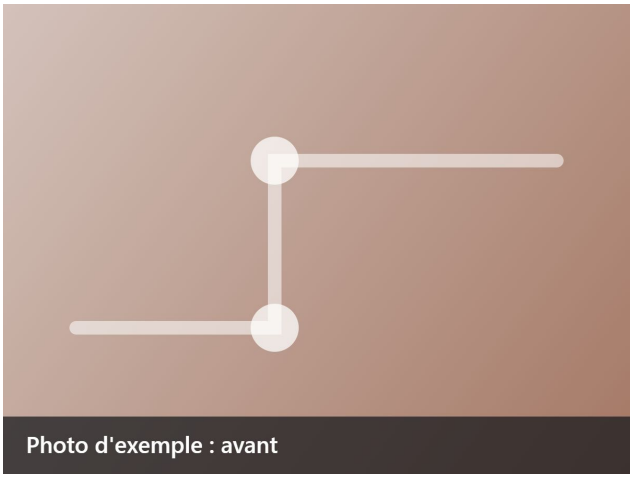

Avant : raccord fissuré sous l'évier

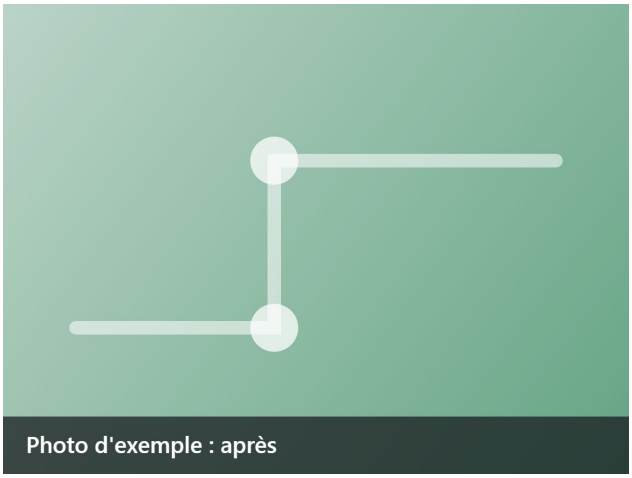

Après : siphon neuf posé et contrôlé

INTERVENANT

Karim B.



Signé le 12/11/2026 à 02h54

CLIENT

Mme Martin



Signé le 12/11/2026 à 02h54
